

# Le déploiement de la fibre

**Point d'étape : rappels et focus sur les communes de la CCVH**

\* Extraits du document présenté lors du Conseil syndical du 5/10/20

# Périgord Numérique

(des infrastructures vers l'utilisateur)

Le **Syndicat Mixte Périgord Numérique (SMPN)** est créé en 2014 avec :

- Le Département de la Dordogne,
- La Région Nouvelle Aquitaine,
- Le SDE 24
- Toutes les Communautés de Communes et d'Agglomération de la Dordogne.

Son champ d'action est le numérique dans son ensemble,

l'objectif : l'accès au THD pour tous et partout

pour aller de l'infrastructure vers l'utilisateur

# des choix politiques forts :

- **100 % FTTH**
- **100 % du territoire**
- **100 % réseau public**
- **100 % des entreprises raccordées**
- **Fin des travaux 2025**

**29 /03/2019 : révision du schéma directeur**

- **Un calendrier raccourci : Fin tvx = 2029 → 2025**
- **Une nouvelle carte de déploiement**
- **Un nouveau plan de financement**
- **Un grand emprunt pour l'attractivité de la Dordogne**

# Les conditions de mise en œuvre et le calendrier

- Un grand emprunt pour la modernité et l'attractivité (2019) **réalisé**
- Des engagements de financement des membres du SMPN (juin 2019) **réalisé**
- Engagement financier de l'Etat, **en cours objectif 2020 ( + 28 M€ avec F.R.)**
  - ✓ **30/11/2020 : Comité Syndical : vote du budget Phase 2** **réalisé**
- Lancement des premiers marchés de la Phase 2
- Continuité de la commercialisation des prises
- Enchaînement sans rupture sur la phase 2
  - Lancement des études fin 2020 (phase 2)
  - Début travaux 2022 (phase 2)

# Une phase 1 (2017 -2021) bien avancée



Un déploiement bien engagé

Infrastructure réseau RIP Dordogne	Nombre de NRO	Nombre de SRO	Collecte (km)
Phase études et Travaux démarrés	6	138	340
Installés	14	30	137
Total	20	168	477
Totaux phase 1	20	197	560

La Phase 1 et la Phase 2 en continuité

	Total prises	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Phase 1	76 126	267	25 000	40 000	10 859	0	0	0
Phase 2	150 874	0	0	0	27 431	41 147	41 147	41 149
Total par année		267	25 000	40 000	38 290	41 147	41 147	41 149
Total cumulé	227 000	267	25 267	65 267	103 557	144 704	185 851	227 000

# Phasage FTTH

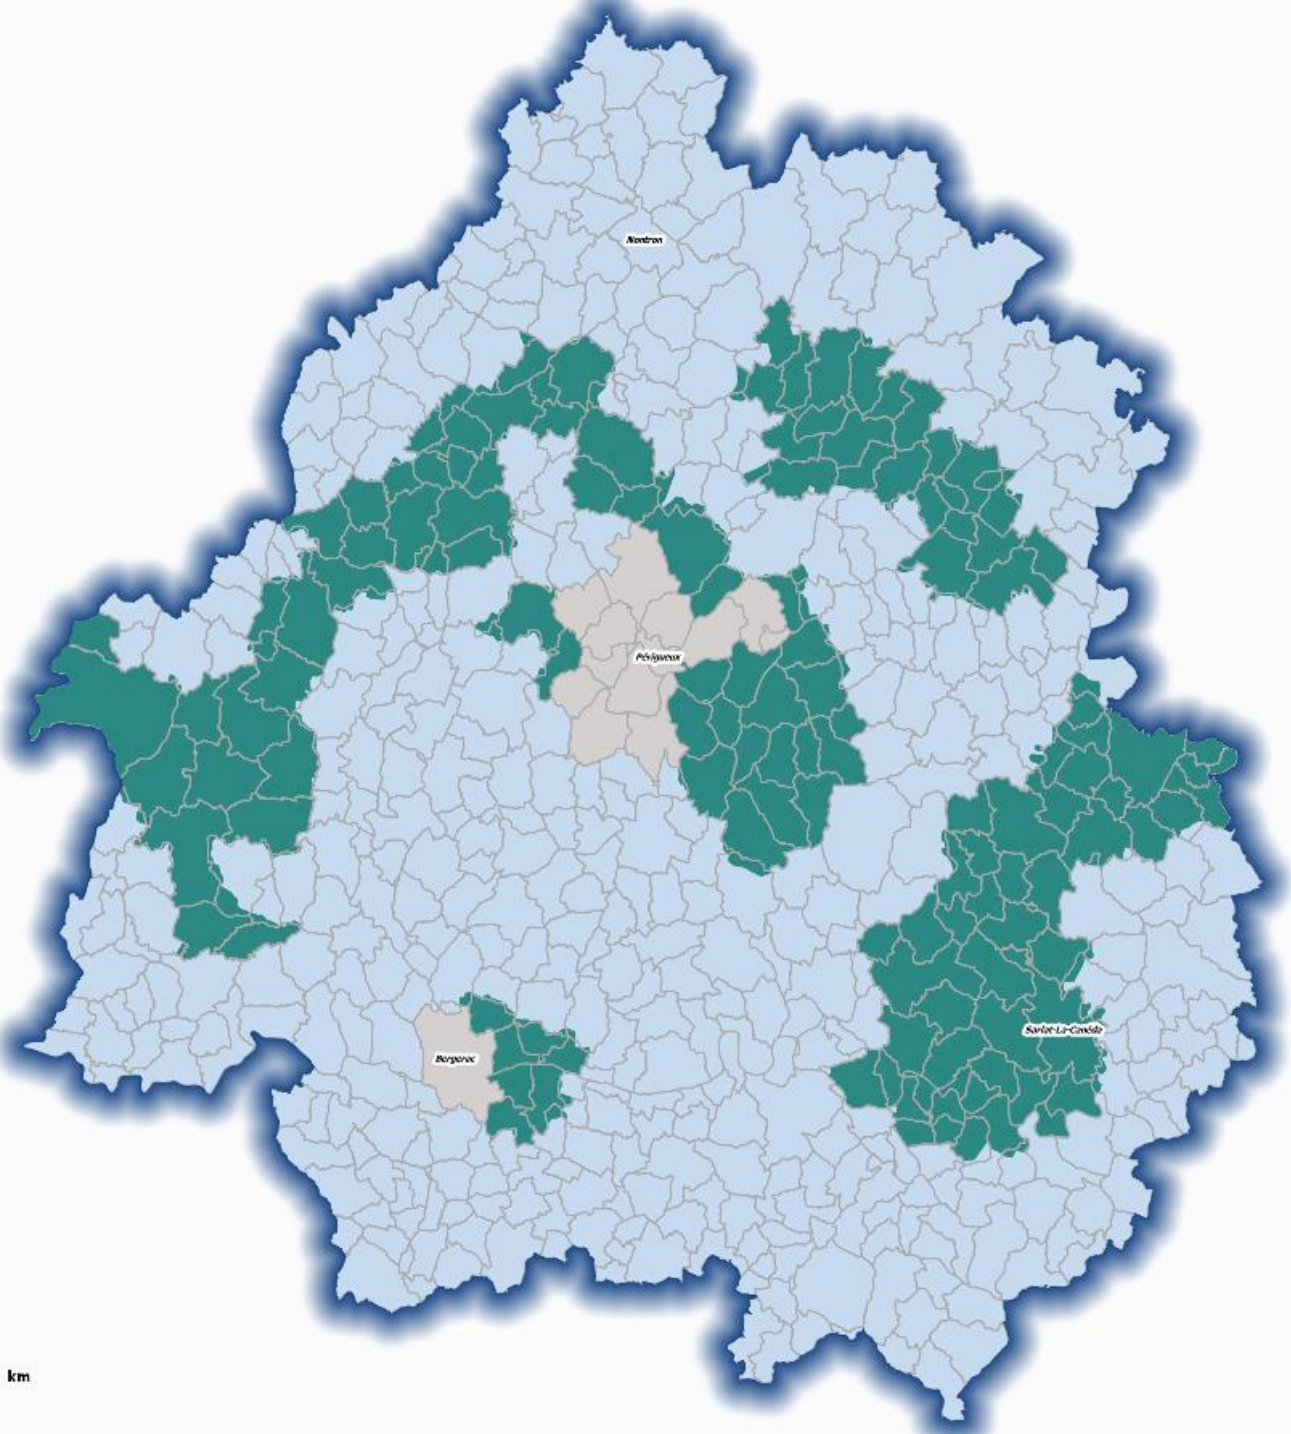

# Plan de financement phase 2

- Répartition des subventions par financeurs

Financeurs	Subvention (k€)	%	Obtenu
FSN	28 000	10 %	En cours
FEDER	10 000	4 %	En étude
Région	40 000	14 %	√
Département	40 000	14 %	√
EPCI	9 000	3 %	√
SDE24	0	0 %	√
<b>TOTAL subventions</b>	<b>127 000</b>	<b>45 %</b>	
<b>SMPN (Emprunt)</b>	<b>180 000</b>	<b>55 %</b>	√
<b>TOTAL</b>	<b>308 000</b>	<b>100 %</b>	




Proposition d'allotissement:

- Lot 1
- Lot 2
- Lot 3
- Lot 4
- Lot 5

- Zone AMII
- Communes
- Phase 1
- Cantons
- ZANRO

## Allotissement phase 2 en 5 lots

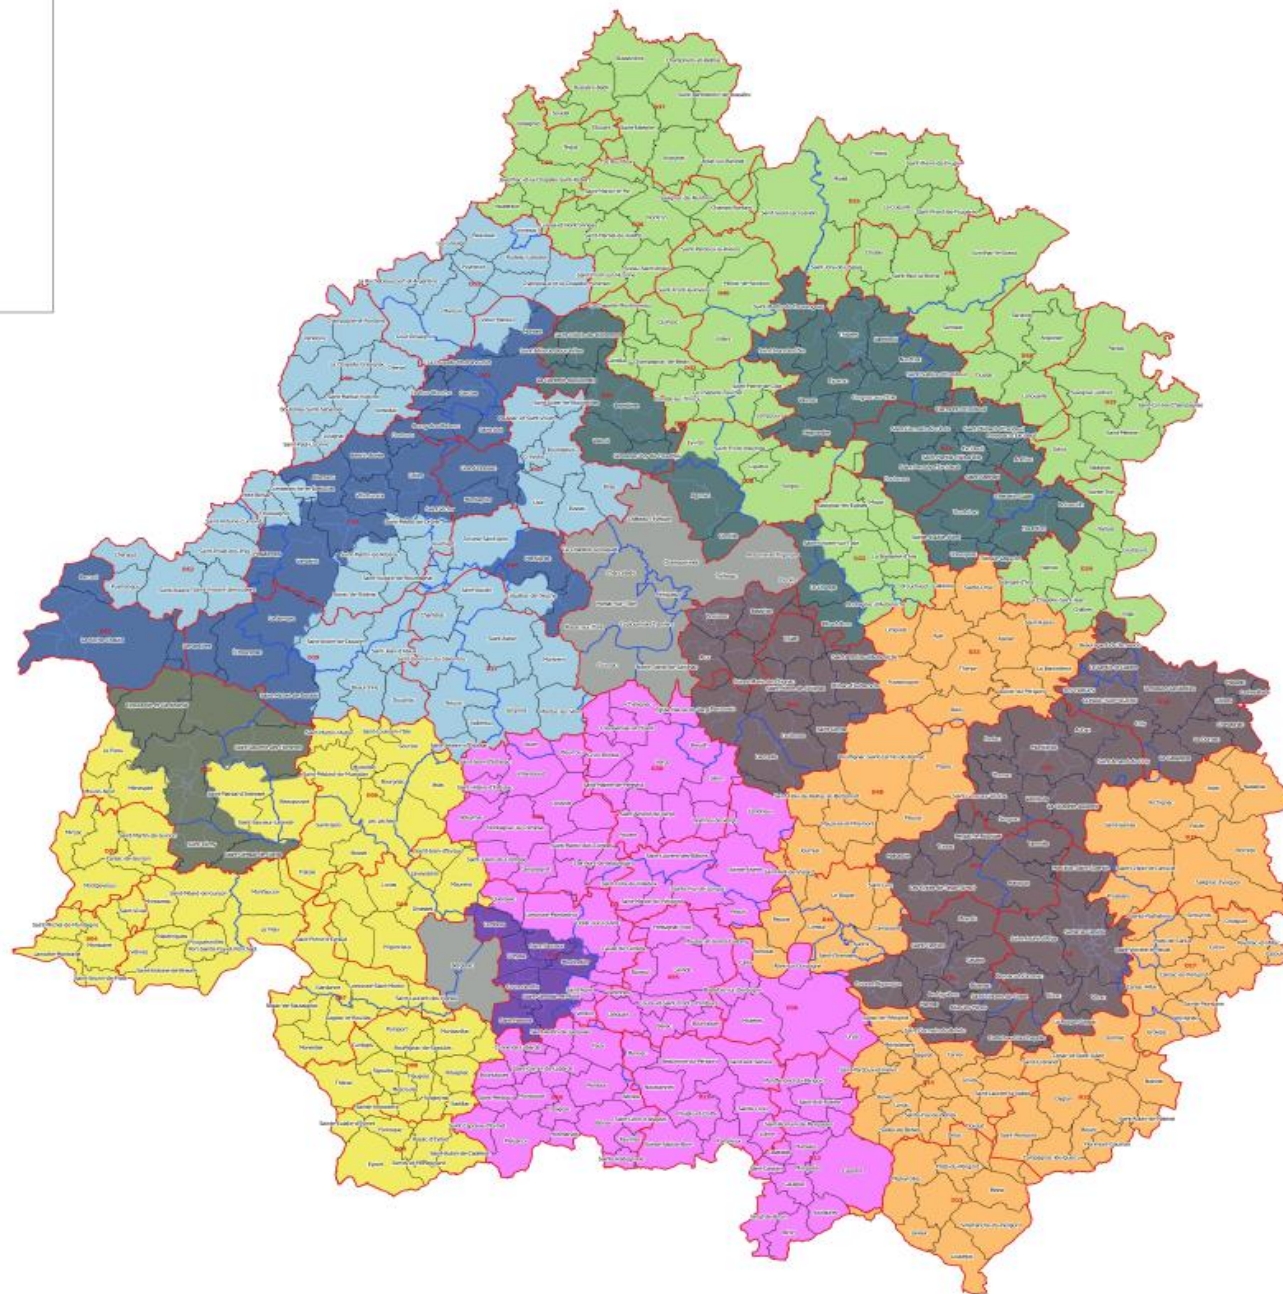


# La mise en œuvre et le calendrier sur la CCVH

- Une partie de la Communauté de communes en **Phase 1 : lots 2 et 3**
  - **LOT 2** et **LOT 3** →
  - des travaux débutés et qui avancent au rythme prévu
  - livraisons des premières prises fin 2020
- Les autres communes en **Phase 2 : lot 4** →
  - études et travaux à partir de 2022
  - fin des travaux et livraisons des prises avant fin 2025
  - pas de date actuellement à préciser...


**Rappel : la fin initiale était 2029/2030 !!**



# Avancement transport et distribution Lot 2-Sud

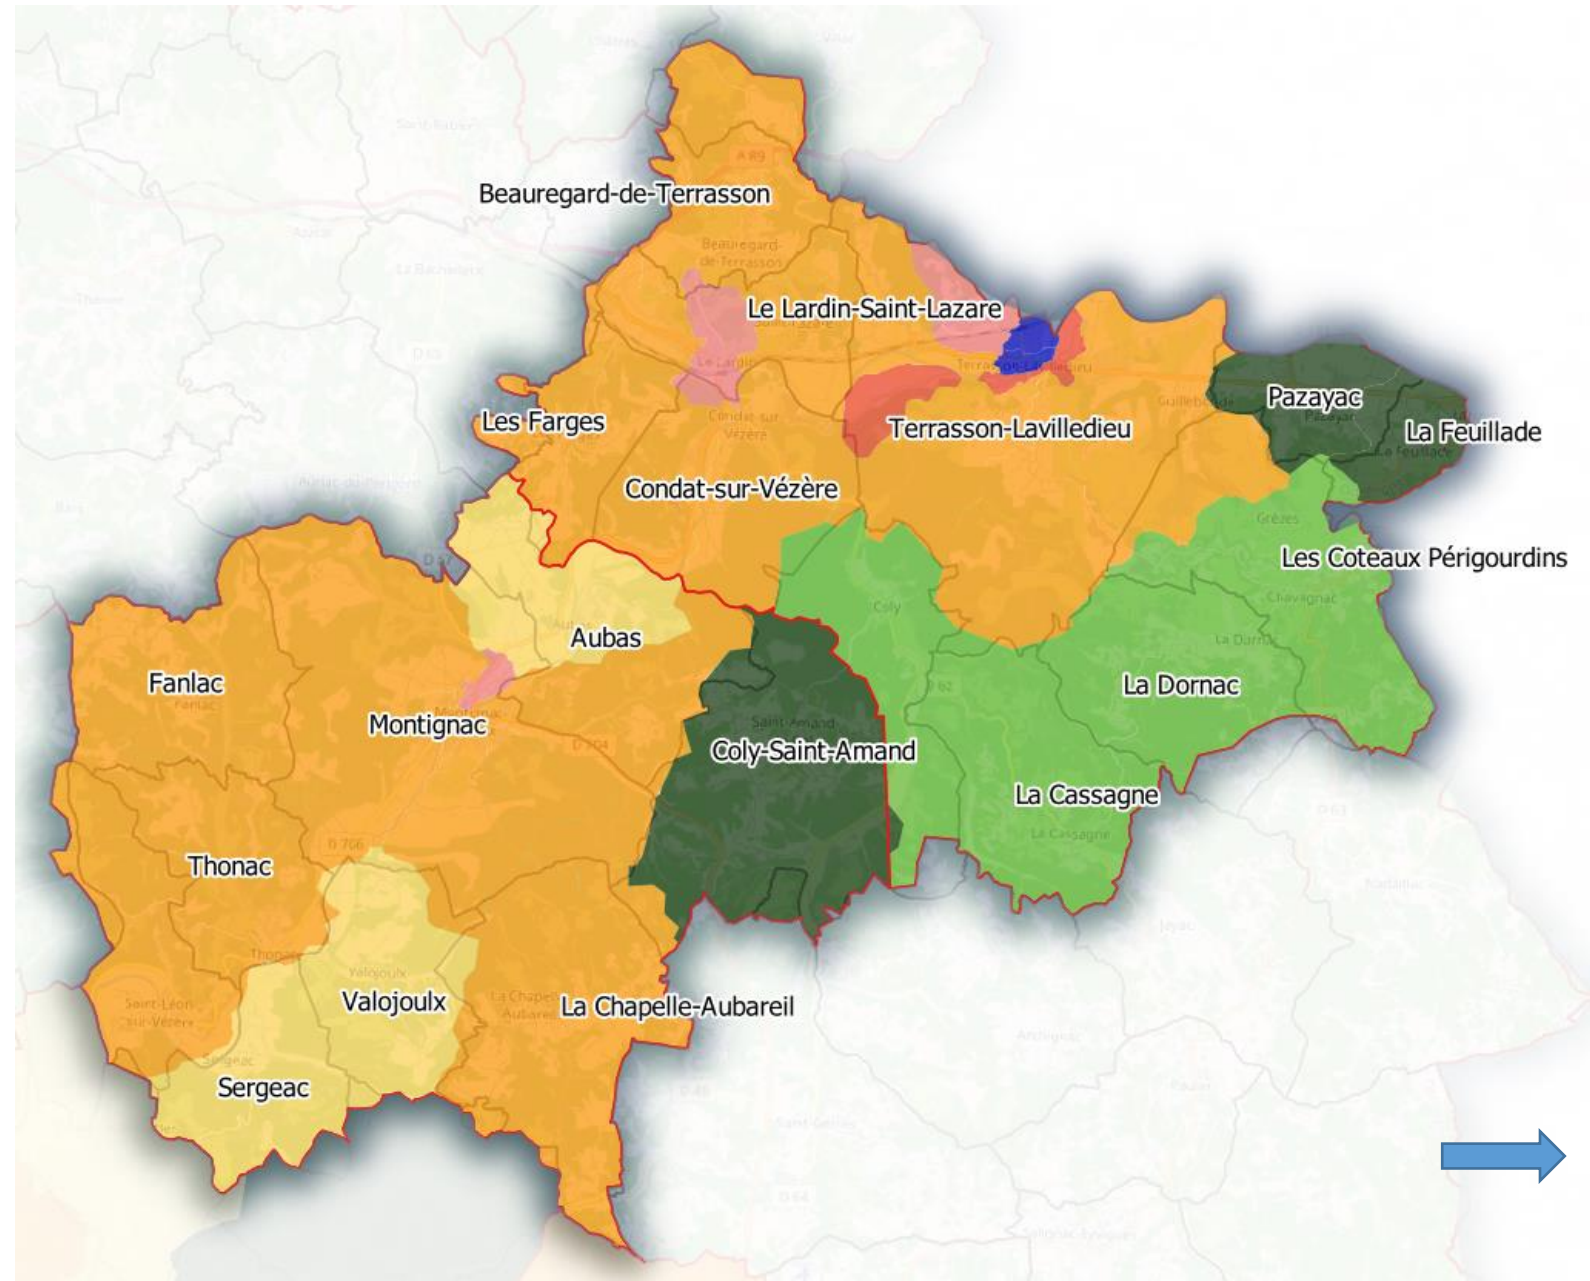

# Avancement transport et distribution Lot 3

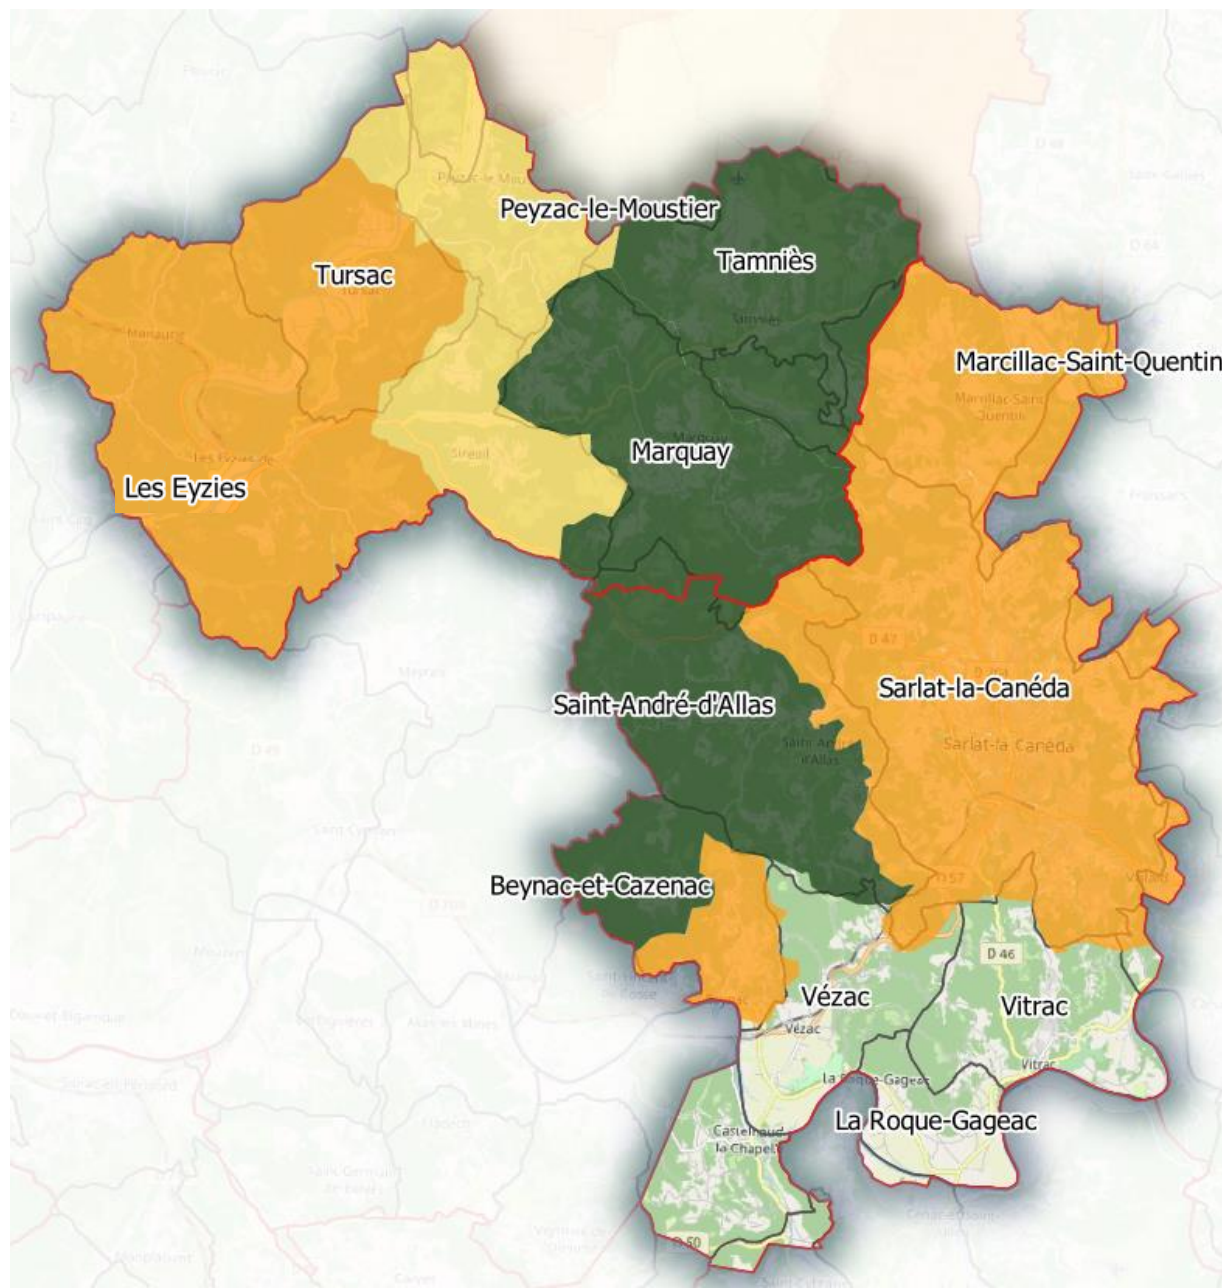

# Et maintenant !



## Préparation du début de la Phase 2 :

- Construction du réseau de distribution pour un ETALEMENT des plaques
- Prise en compte des besoins spécifiques ou des secteurs à très faible débit

### En pratique...

- Des chantiers un peu partout (plusieurs entreprises)
- en fonction des priorités fixées
- mais aussi de la logique du travail...! ( NRO, SRO, réseau, déploiement )

# SMPN : mais aussi, vers une téléphonie mobile de meilleure qualité...

- **Périgord Numérique** : co-leader du comité directeur Téléphonie Mobile 24
  - ✓ Recensement des implantations des futurs pylônes dans le cadre du [New Deal Mobile](#)
  - ✓ Rôle consultatif auprès de France Mobile
  - ✓ Dépôt des demandes, après avis et priorisation du comité de la Dordogne en lien permanent avec France Mobile
- **Résultat**: réalisation de l'implantation de **55 pylônes sur la Dordogne en 3 ans**
  - ➔ **Encore 40 à venir dans ce cadre :**
    - la carte d'implantation est connue 
    - les maires sont le relais d'information du SMPN pour les pylones d'opérateur en propre (demande en mairie !) 



## A venir :

- un état d'avancement actualisé sur le site du SMPN
- une information générale (brochure) pour tous

?

Contacts pour les usagers :

